

双阳区奢岭街道三嘴村黑臭水体

整治项目验收报告

长春市双阳区人民政府

编制日期：2022年11月7日



工程竣工验收报告

项目工程名称	山嘴村黑臭水体整治项目
沟渠面积	100 m ²
施工单位名称	长春市广润水务有限公司
监管单位名称	双阳区奢岭街道
开工时间	2021 年 5 月
竣工时间	2021 年 10 月
工程投资	80000 元
联合验收单位	长春市生态环境局双阳区分局、双阳区水利局、双阳区农业农村局、奢岭街道办事处

一、奢岭街道三嘴村黑臭水体项目整治情况

（一）基本情况

双阳区奢岭街道三嘴村黑臭水体项目，位于三嘴村9社，点位坐标：经度125°39'2"，纬度43°40'53"，沟渠面积约100m²，三嘴村沟渠形成黑臭水体主要原因是本村的生活污水、畜禽养殖粪污以及生活垃圾长期堆放在水体周边，导致水体长时间淤积无法排出，形成死水区域，经过长时间停留后发黑发臭。奢岭街道办事处政府高度重视，委托河海大学编制了《三嘴村黑臭水体整治工作方案》，区生态环境部门负责督促调度，奢岭街道负责对沟渠进行专项整治。

（二）采取清淤疏浚、控源截污治理措施

三嘴村黑臭水体治理的关键和难点在于控源截污环节，要突出源头治理，对水体两岸排入的污水进行整治，坚持以堵促治，大幅度减少污水流入水体。实施垃圾清理、清淤疏浚，对农村生活污水集中处理回收利用，对沟渠进行全面清理，让水流通畅，不留积水，将原有污水抽出送至污水处理厂处理。防控农业面源污染物入河，岸边摘花种树，改善环境，达到美化绿化的效果。

（三）治理后效果

奢岭街道办事处对把上游堆积的畜禽粪污，生活垃圾进行清理转运处理，对沟渠进行彻底疏通，水流保持通畅，岸边种植花草树木，达到美化绿化的效果，环境明显改善。三嘴村委会派专人常态化巡视管理管护，杜绝村民乱堆乱放现

象，雨季水体也不存在异味异物黑臭情况，沟渠水底无淤泥，岸边无垃圾，三嘴村沟渠附近的广大农民群众对沟渠的治理情况非常满意。

二、治理前、中、后照片对比

（一）治理前照片



(二) 治理中照片




(三) 治理后照片



三、各部门联合验收

11月3日，长春市生态环境局双阳区分局组织双阳区水利局、农业农村局、奢岭街道办事处、三嘴村委会等部门对新民村黑臭水体治理工作进行联合验收，经现场检查，该黑臭水体现水质清澈，周边生活垃圾转运及时彻底，沟渠内清洁通畅，岸边花草树木涨势良好，无源头污染及黑臭现象，治理效果群众相当满意，三嘴村建立长效管理机制，对治理区域进行严格管控，安排人员进行日常维护，确保水体长治久清。根据水质检测结果，指标均已达到标准，验收合格。（奢岭街道办事处新民村黑臭水体治理现场验收表附后）

参加验收人员照片

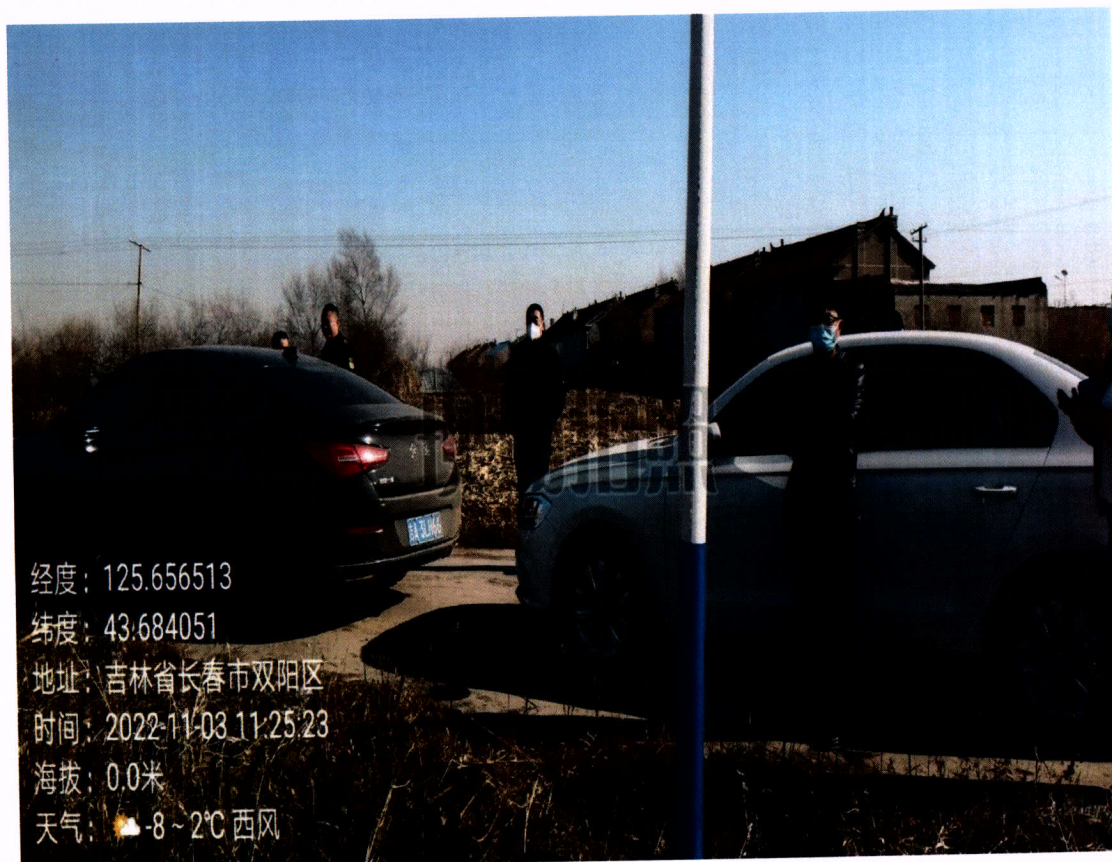



四、奢岭街道三嘴村治理后的沟渠运维管理制度

奢岭街道办事处三嘴村成立了沟渠运维管理领导小组和管理制度，该村派专人负责水体日常管护，对生活垃圾进行及时清理转运，对沟渠进行彻底疏通，保持水流通畅，定期维护岸边花草树木，保持季节美化绿化的效果，杜绝村民乱堆乱放现象，确保沟渠水底无淤泥，岸边无垃圾，三嘴村沟渠附近的广大农民群众对治理情况非常满意。（奢岭街道三嘴村沟渠长效管理制度附后）

五、检测数据合格

2022年11月对奢岭街道三嘴村沟渠内（三个点位）进行取样检测，检测结果分别显示：1. 氨氮 0.380mg/L、溶解

氧 7.6mg/L、透明度大于 33cm；2. 氨氮 0.492mg/L、溶解氧 7.7mg/L、透明度大于 33cm，3. 氨氮 0.448mg/L、溶解氧 7.5mg/L、透明度大于 33cm，监测结果均合格。（检测报告附后）

六、村民满意度高

2022 年 10 月初奢岭街道办事处对三嘴村沟渠黑臭现象进行民主测评，村民反馈沟渠没有黑臭异味，沟渠沿岸无乱堆乱放现象，环境改善明显，村民满意度 100%。（三嘴村黑臭水体治理满意度调查表附后）

